



Паспорт об'єкту відновлення

Моніторинг закупівель:

**Нове будівництво протирадіаційного укриття на території
Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за
адресою: вул. Шкільна, 5А, с.Семененкове, Запорізький район, Запорізька
область**

Назва об'єкту	Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с.Семененкове, Запорізький район, Запорізька область
Адреса об'єкту	вул. Шкільна, 5А, с.Семененкове, Запорізький район, Запорізька область
Тип об'єкту	Протирадіаційне укриття освітнього закладу
Громада, в якій розташований об'єкт (назва громади, район, область)	Павлівська громада Запорізької області
Власник об'єкту (в кого перебуває на балансі)	Павлівська сільська рада
Дата руйнування / пошкодження об'єкту	Руйнувань не зазнав
Стан руйнування / пошкодження об'єкту – слабе /сильне/ повне руйнування	Руйнувань не зазнав
Дата початку відновлення / відбудови / будівництва об'єкту*	За даними системи DREAM - Квітень 2024 року За даними Додатку №2 до договору № 22/10-НБ/Сем від 22.10.2024 з підрядною організацією Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив"

	<p>#36315588 - жовтень 2024 року. Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ012241030809 від 31.10.2024 року.</p>
<p>Дата завершення (якщо вже завершено) відновлення / відбудови / будівництва об'єкту</p>	<p>За даними системи DREAM – вересень 2024 року.</p> <p>За даними договору № 22/10-НБ/Сем від 22.10.2024 з підрядною організацією Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив" #36315588 – грудень 2025 року.</p> <p>Після внесення змін до Договору з підрядною організацією, строк зменшено до 31.12. 2024 року підстава додаткова угода № 1 від до договору від 22.10.2024 № 22/10-НБ/Сем</p> <p>Станом на 28.12.2024 року об'єкт в експлуатацію не здано.</p>
<p>Джерела фінансування об'єкту</p>	<p>Згідно даним системи DREAM- місцевий бюджет 550 000,00 грн.</p> <p>Планувалось використання наступних джерел фінансування: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту- 42 418 397,00 грн. ; Кошти Запорізького обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя-18 179 313,00 грн; Загалом 60 597 710,00 грн.</p> <p>Проте, статус заявки на отримання субвенції- “Невдала”.</p> <p>Згідно умов договору № 22/10-НБ/Сем від 22.10.2024 з підрядною організацією ТОВ"Компанія Позитив" #36315588, згідно Графіку оплати за Договором в 2024 році- 60 597 710,00 грн. коштом обласного бюджету.</p>
<p>Вартість відновлення /відбудови об'єкту</p>	<p>Відповідно до даних DREAM, орієнтовний бюджет проекту- 63 226 358,00 грн.</p>
<p>Типи здійснених та запланованих робіт з відбудови та відновлення (відбудова /нове будівництво)</p>	<p>Нове будівництво</p>
<p>Доступ до яких послуг відновлює відповідний проєкт**</p>	<p>Проєкт відновлює доступ до освітніх послуг в режимі оффлайн у прифронтовому регіоні, який постійно обстрілюється військовими рф.</p>

Ключовий висновок моніторингу (7-10 речень, заповнюється після завершення моніторингу)

Семененківський ліцей Павлівської сільської ради руйнувань не зазнавав. Проект відноситься до проектів відновлення. І направлений на повернення дітей до оффлайн-навчання після дворічної дистанційної освіти через військову агресію рф.

І обрання проекту, і розподіл фінансування було здійснено Розпорядженням голови Запорізької ОДА одноособово. Критеріями зазначаються вимоги Постанови КМУ №419 від 28.04.2023 року. Громадськість до процесу обрання проекту не долучалися .

Проектно-кошторисна документація (ПКД) розроблена на базі проектно-кошторисної документації (ПКД) повторного використання, яку можна адаптувати під особливості кожного закладу освіти, презентованої МОН за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Buffet Foundation. В загальному доступі, на платформі «Моя Фортеця», замовником обраний проект повторного використання «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю [200 осіб](#) навчального закладу загальної середньої освіти» (PD01:7659-1598-6801-5770), який пройшов експертизу (EX01:1880-9039-2753-0564) на відповідність вимогам чинних нормативних документів, в тому числі ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».

Рішенням Павлівської сільської ради №16 від **12.04.2024** року Про участь у конкурсному відборі та забезпечення співфінансування проекту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради за адресою:Запорізька область, Запорізький район, с.Семененкове, вул. Шкільна,5А» проект розміщено в системі [Dream](#).

22.04.2024 року Замовник Павлівська сільська рада Запорізької області уклала Договір №45 з КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради Запорізької області на розробку проектно-кошторисної документації (ПКД). Сплативши за це 533 677,48 грн. з бюджету Павлівської сільської ради. Підставою для проектування зазначено рішення Павлівської сільської ради №3 від 12.04.2024 року.

22.10. 2024 року ДП “Місцеві дороги Запорізької області” укладено Договір № 22/10-НБ/Сем з підрядною організацією ТОВ "Компанія Позитив"#36315588. Яку відібрано за процедурою відкритих торгів з особливостями **без конкуренції**.

	<p>Фірма підрядника є фігурантом кримінальної справи стосовно розкрадання бюджетних коштів на будівництві, а також має сумнівну репутацію в медіа.</p> <p>На основних будівельних матеріалах - бетонних сумішах виявлено завищення цін на 4 500 000,00 грн.</p> <p>22.10.2024 року до Договору № 22/10-НБ/Сем від 22.10.2024 року внесено зміни: строк дії Договору зменшено на 1 рік з 31.12.2025 року на 31.12.2024 року, змінено графіки проведення робіт, так замість 14 місяців укриття мають побудувати за 2 місяці до кінця 2024 року.. Що несе ризик недотримання технологічних процесів на будівництві, техніки безпеки і низької якості об'єкт.</p> <p>Станом на 28.12.2024 року на об'єкті продовжуються будівельні роботи.</p> <p>На офіційному веб-сайті Запорізької ОДА/ОВА рубрики висвітлення відбудови/відновлення не створено, інформація документи щодо реалізації проекту відсутні, перебіг обрані проектів не висвітлюється. Реалізації проекту є виключно новинному форматі.</p> <p>Веб-сайт ДП «Місцеві дороги Запорізької області, як веб-сайт розпорядника бюджетних коштів і розпорядника публічної інформації, не відповідає вимогам законодавства і не містить належної інформації про реалізацію проекту. Знайдена лише одна узагальнююча інформація в розділі новин.</p> <p>Дані, внесені ініціатором в систему DREAM в частині фінансування та стану реалізації проекту, не відповідають даним первинної документації замовника (рішенням, Договорам тощо).</p>
--	---

Цей матеріал підготовлено в рамках проекту "Прозора відбудова Запорізької області", що реалізується в межах субгрантингового компоненту проекту "Контроль витрат на відновлення", який реалізується за підтримки Європейського Союзу. Зміст звіту моніторингу є виключною відповідальністю ГО «Народний Захист» і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу. Проект "Контроль витрат на відновлення" впроваджують Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та ГО "Технології прогресу".

Планування відновлення

1. Чи розроблено та оприлюднено в громаді, в якій розташований об'єкт відбудови/відновлення, план та програму відбудови та відновлення?

Відповідь: Ні

Відповідно до відповіді Запорізької ОВА на запит, вих.№ 79-3-409-Е від 23.09.2024 року, в Запорізькій області немає Плану відновлення та розвитку. І роботи по його створенню не проводились через відсутність затвердженого Кабміном переліку територій відновлення. (Як того вимагає Постанова КМУ № 731 від 18.07.2023). Відповідно, територіальні громади також План відновлення не розробляли.

2. Чи залучали/залучають до розробки плану/програми та спеціальної політики щодо власних пріоритетів відновлення та відбудови громадськості?

Відповідь: Ні

3. Чи подає відповідна громада проєкти на платформу DREAM?

Відповідь: Так

В системі [DREAM](#) розміщено 3 проєкти. Два з яких частково профінансовані.

Ініціювання та затвердження проєкту відновлення

1. Чи пов'язаний проєкт безпосередньо з ліквідацією наслідків збройної агресії рф:

Відповідь: Так

Семененківський ліцей Павлівської сільської ради руйнувань не зазнав. Відноситься до проєкту відновлення. Проєкт направлений на повернення дітей до оффлайн-навчання після дворічної дистанційної освіти через військову агресію рф. Будівництво протирадіаційного укриття відбувається у безпосередній близькості до будівлі школи.

2. Чи було вже повністю профінансовано проєкт?

Відповідь: Ні

В системі [DREAM](#) повідомляється, що фінансове покриття є на рівні 0,8% від суми проєкту у **63 200 000,00** грн. Станом на кінець листопада 2024 року за даними Dream Аналітика по об'єкту [укладено](#) один контракт .

Згідно умов додаткової угоди від 22.10.2024 до Договору № 22/10-НБ/Сем від 22.10.2024 між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ "Компанія Позитив":

Ціна Договору становить 60 587 710,00 грн (шістдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот десять гривень 0 копійок), в.т ч. ПДВ - 10 097 951,66 грн. З них кошти обласного (місцевого) бюджету - 60 587 710,00 грн.

З них на 2024 рік - 60 587 710,00 грн.

Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».

Змінами до Договору від 22.10.2024 року (внесеними на підставі рішення Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 29.08.2024 №4 «Про внесення змін

отримала статус “Невдалий” через перевищення суми запиту. Інформації, що заявка подавалась повторно і отримала фінансування з субвенції немає. Зазначено лише 550 000 грн з бюджету Павлівської сільської ради на розробку ПКД.

Об'єкти інвестицій

Тип: Роботи, Клас: 45216129-4, Місце: Семененкове село

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с.Семененкове, Запорізький район, Запорізька область

Немає даних

Історія погодження заявки

Дата	Автор	Номер рішення	Сума	Статус	Коментарі
09.06.2024	DREAM-UA-100624-FBEE8491	56903722	Невдалий	Перевищення суми запиту	

Статус Заявки: Не схвалено
Дата подані Заявки: 28.05.2024
Сума заявки: 56'903'722.00 GRN
Заявки: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Погоджувач: ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сектор економіки: Загальна середня освіта

Місцевий бюджет (за виключенням субвенцій з державного бюджету)- 550 000,00 грн.

Фінансування

Загальний обсяг підтверджених джерел фінансування: **2550.0 тис**

0.87%

Джерела фінансування

Публічні кошти

Місцевий бюджет (за виключенням субвенцій з державного бюджету)	Всього: 8 550,000.00
Юридичні підстави: Рішення сесії Павлівської сільської ради від 12.04.2024 №215	
Місцевий бюджет (за виключенням субвенцій з державного бюджету)	Павлівська 8550,000.00 22/04/2024 - 25/12/2024 Індикативний

Статус: Реалізується, Від Квіт. 2024
Сектор економіки: Освіта, Загальна середня освіта
Характер проєкту: Нове будівництво
Географія проєкту: Павлівська громада, Село Семененкове
Орієнтовна тривалість: 5 місяців
Орієнтовний бюджет: 63'226'358.00
Ініціатор проєкту: ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Виконавець проєкту: ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Донори: Павлівська

Підтримати проєкт зараз

Згідно п.5 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 419: «Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування: для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1,1: не більш як 70

відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів».

Однак в системі Dream, укладених договорах на будівництво, офіційних сайтах Павлівської сільської ради та Запорізької обласної адміністрації не оприлюднено жодних розпорядчих документів про фінансування проекту, крім зазначеного у рішенні Павлівської сільської ради №16 від 12.04.2024 року зобов'язання забезпечити співфінансування з бюджету Павлівської сільської територіальної громади на 2024 рік кошти в розмірі не менше 10% від вартості даного проекту. На інформаційні запити Запорізька обласна адміністрація відповіді не надала.

Згідно Прозорро фінансування проекту з державного бюджету складає 42 418 397 грн, однак інформації про юридичну підставу виділення цих коштів не зазначено.

Інформація про замовника

Замовник чи не замовник

1. Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #42698149
3. Місцезнаходження: Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, 69095, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
4. Категорія: Юридикальна особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі

5. Конкретна назва предмета закупівлі: **«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семененкове, Запорізький район, Запорізька область» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель**

6. Коді відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

Про класифікатор ДК 021:2015

ДК021-2015: 45210000-2 — Будівництво будівель

7. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 — Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: **60 597 710 UAH**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		18179313 UAH
Державний бюджет України		42418397 UAH



ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання
сорок п'ята позачергова сесія

РІШЕННЯ

12.04.2024

№16

Про участь у конкурсному відборі та забезпечення співфінансування проекту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Семененкове, вул.Шкільна, 5А»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України», за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, охорони здоров'я, гуманітарних питань, освіти, культури та соціального захисту населення, фінансів та бюджету, на виконання заходів «Програми будівництва, реконструкції та ремонту захисних споруд Павлівської сільської ради на 2024-2025 роки», з метою створення безпечних умов для вихованців і здобувачів освіти у закладах освіти та мешканців громади, Павлівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити заступнику сільського голови Третяк Наталі подати пакет документів в систему DREAM для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проекту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Семененкове, вул.Шкільна, 5А».

2. При успішному конкурсному відборі проекту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Семененкове, вул.Шкільна, 5А», забезпечити співфінансування з бюджету Павлівської сільської територіальної громади на 2024 рік кошти в розмірі не менше 10% від вартості даного проекту.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань з питань соціально-економічного розвитку, охорони здоров'я, гуманітарних питань, освіти, культури та соціального захисту населення, фінансів та бюджету.

Сільський голова



Анатолій КЛИМЕНКО

4. Чи був процес затвердження проекту відкритим і прозорим? Чи було обрано проект за конкурентною процедурою відбору серед інших проектів?

Відповідь: Ні

Рішенням Павлівської сільської ради №16 від 12.04.2024 року Про участь у конкурсному відборі та забезпечення співфінансування проекту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Семененкове, вул. Шкільна, 5А» проект розміщено в системі [Dream](#).

Згідно інформації в системі [DREAM](#), фінансування планувалось здійснювати коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту в розмірі, однак заявка по даному об'єкту отримала статус “Невдалий” через перевищення суми запиту. Інформації, що заявка подавалась повторно і отримала фінансування з субвенції немає. Зазначено лише 550 000,00 грн з бюджету Павлівської сільської ради на розробку ПКД.

22.04.2024 року Замовник Павлівська сільська рада Запорізької області уклала Договір №45 з КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради Запорізької області на розробку проектно-кошторисної документації (ПКД). Сума у 533 677,48 грн. сплачена з бюджету

Павлівської сільської ради за виготовлення проектно-кошторисної документації. Підставою для проектування зазначено рішення Павлівської сільської ради №3 від 12.04.2024 року.

5. Чи проводилась оцінка громадської думки на етапі підготовки проекту? Якщо проводилася, то чи не була така оцінка формальною (чи була вона врахована)?

Відповідь: Ні

На етапі підготовки цього проекту громадськість до процесу не залучалась.

В системі DREAM ініціатор зазначив, що реалізує проект на виконання Програми №2 від 12.04.2024, яка створена для забезпечення безпечних умов для вихованців і здобувачів освіти у закладах освіти та мешканців Павлівської громади Запорізької області. Програмні документи не відносяться до стратегічних документів. Згідно п.2 статті 7 ЗУ Про засади [державної регіональної](#) політики, до документів стратегічного планування державної регіональної політики належать:


- 1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
- 2) регіональні стратегії розвитку;
- 3) стратегії розвитку територіальних громад.

6. Чи має громадськість доступ до інформації про ініційований проект?

Відповідь: Ні

В системі станом на 28.12.2024 року міститься інформація, що не відповідає дійсності, оскільки договори на роботи з розробки ПКД, проведення авторського, технічного контролю та договір підряду вже укладені:

Реалізація проекту




Контрактні процеси

Категорія	CPV-клас	Очікувана вартість	Сума договору	Статус
н/д	н/д	-	-	Виконання
	н/д	н/д н/д	н/д н/д	з 28.06.2024

На офіційному [веб-сайті](#) Запорізької ОДА/ОВА рубрики з висвітлення відбудови/відновлення не створено, інформація і документи щодо реалізації проекту відсутні, перебіг обрання проектів не висвітлюється. Реалізації проекту є виключно в [новинному форматі](#).

На офіційному [веб-сайті](#) Павлівської сільської ради рубрики з висвітлення відбудови/відновлення не створено, інформація і документи щодо реалізації проєкту відсутні.

На офіційному [веб-сайті](#) ДП «Місцеві дороги Запорізької області», який є належним розпорядником публічної інформації щодо реалізації проєкту, жодного документу не оприлюднено. Перебіг реалізації проєкту не висвітлюється. Знайдено лише обґрунтування закупівлі по будівництву проєкту .



Окремо варто зазначити **про особисті виступи голови ЗОВА в телемарафоні** “Єдині новини” та на офіційних брифінгах місцевим ЗМІ стосовно будівництва “підземних шкіл”.

В лютому 2024 року він [заявив](#) Укрінформ, що до 1 вересня в Запоріжжі будуть “підземні школи”. На 1 вересня жодного ПРУ тобто так званої “підземної школи” побудовано і введено в експлуатацію не було. В серпні 2024 року в телемарафоні він [заявив](#), що вже в жовтні мінімум одна “підземна школа” запрацює, а інші будуть готові до кінця 2024 року. Станом на 31 жовтня 2024 року жодне нове будівництво протирадіаційних укриттів для шкіл не завершено.

Відповідно заяви голови ЗОВА Федорова носять популістичний характер і містять в собі завідомо неправдиву інформацію, яка вводить в оману мешканців Запоріжжя, оскільки очевидно, що на час першої заяви він не мав а ні погоджених субвенцій, а ні укладених договорів. В другій заяві, будівництво таких великих об'єктів неможливо в такі короткі строки за два місяці. Відповідно мешканці Запоріжжя можуть мати хибну інформацію про будівництво протирадіаційних укриттів, яка лунає з офіційних джерел, безпосередньо від голови ЗОВА Івана Федорова.



Що стосується виступів на брифінгах, то тут запорізькі журналісти, навіть [розібрали на тези](#) і виявили численні маніпуляції від Івана Федорова у інформуванні про будівництво протирадіаційних укриттів

Планування та проєктування

Рішенням ПСР №16 від **12.04.2024** року Про участь у конкурсному відборі та забезпечення співфінансування проєкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Семененкове, вул. Шкільна, 5А» проєкт розміщено в системі [Dream](#).

22.04.2024 року Замовник Павлівська сільська рада Запорізької області уклала Договір №45 з КП «Градпроєкт» Мелітопольської міської ради Запорізької області на розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД). Сума у 533 677,48 грн. сплачена з бюджету Павлівської сільської ради за виготовлення проєктно-кошторисної документації. Підставою для проєктування зазначено рішення ПСР №3 від 12.04.2024 року.

31.10.2024 року отримано дозвіл на будівництво ІУ012241030809.

В загальному доступі, на платформі «Моя Фортеця», замовником обраний проєкт повторного використання «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю **200** осіб навчального закладу загальної середньої освіти» (PD01:7659-1598-6801-5770), який пройшов експертизу (EX01:1880-9039-2753-0564) на відповідність вимогам чинних нормативних документів, в тому числі ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Проєктно-кошторисну документацію (ПКД) повторного використання, яку можна адаптувати під особливості кожного закладу освіти презентувало МОН за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Buffet Foundation.

Підставою для проєктування стало рішення Павлівської сільської ради №3 від **12.04.2024** року.

Згідно першого договору будівельні роботи планувалось завершити в грудні 2025 року, але пізніше додатковою угодою №1 від **22.10.2024** року, термін виконання робіт скоротили на 14 місяців і визначили 31.12.2024 р. **Укриття має бути побудовано за 2 місяці.**

1. Чи було обрано проєктну організацію в конкурентний спосіб?

Відповідь: Ні

22.04.2024 року Замовник Павлівська сільська рада Запорізької області уклала Договір №45 з КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради Запорізької області на розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД). Сума у 533 677,48 грн. сплачена з бюджету Павлівської сільської ради за виготовлення проєктно-кошторисної документації. Підставою для проєктування зазначено рішення ПСР №3 від 12.04.2024 року. Закупівля відбулась без використання електронної системи Прозорро.

2. Чи є істотні ризики, пов'язані з проєктною організацією?

Відповідь: Так

Засновником КП «Градпроект» є Мелітопольська міська рада Запорізької області, міським головою Мелітопольської міської ради є **Іван Сергійович Федоров**.

Засновником ДП «Місцеві дороги Запорізької області» є ЗОВА, **голова ЗОВА також Іван Сергійович Федоров**, а директором ДП одразу після призначення Федорова на посаду держслужбовця, стала Вікторія Репашевська, яка до цього очолювала департамент ЖКГ Мелітопольської міської ради. Корупційним ризиком у цьому випадку є можливий опосередкований чи безпосередній вплив Івана Федорова, який **одночасно займає дві несумісні посади**, може призначати на посади посадовців ММР та впливати на вибір підрядника підпорядкованого все тій самій Мелітопольській міській раді або фірмам, які раніше отримували від неї підряди в Мелітополі.

Авторський нагляд за проєктами побудови шкіл-укриттів обласна влада через ДП «Місцеві дороги» також замовила у фірми родом з Мелітополя. ТОВ «Градпроект-М», створене у 2020 році, у жовтні 2022-го змінило юридичну адресу на Запоріжжя. Його кінцевим бенефіціарним власником є **Максим Володимирович Єгоркін**.

Технічний нагляд замовлено у ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-М», яке створено у 2020 році в Мелітополі і до вересня 2023 було там зареєстровано, з 2023 адреса змінилась на м.Запоріжжя. Власником фірми знов є все той самий **Єгоркін М.В.**

За авторський нагляд ДП «МДЗО» сплатить ТОВ «Градпроект-М» - 74 947,37 грн, а за технічний нагляд ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-М» – 689 734,04 грн. Всі закупівлі пройшли без використання електронної системи Прозорро.

3. Чи створив обраний спосіб відновлення додаткові корупційні ризики, які можливо було уникнути (наприклад, обрання більш дорогого способу відновлення, необґрунтовані витрати тощо)?

Відповідь: Так

Функції замовника і розпорядника бюджетних коштів Головою Запорізької ОДА/ОВА передано підконтрольному ОДА- ДП «Місцеві дороги Запорізької області». В умовах керівництва обласною військовою адміністрацією мера міста Мелітополя у відпустці Івана Федорова, після приходу на посаду якого, керівником КП «Місцеві дороги Запорізької області» була призначена


екс-підлегла Івана Федорова -Репашевська Вікторія Дмитрівна. А функції проєктувальника без конкурсу віддано мелітопольському КП- КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради.

Виконання технічного та авторського нагляду також доручено мелітопольським виконавцям. Які проігнорували зміну у технології будівництва (зменшення строку виконання робіт з грудня 2025 року на 31.12.2024 року), що може вилитись у передчасне руйнування об'єкту і невідповідності своїм захисним функціям.

Що в комплексі створює ситуацію, що має ознаки корупційних ризиків, яких можливо було уникнути.

Обрання виконавців робіт по проєкту

Нове будівництво ПРУ на території
Семененківського ліцею Павлівської сільської ради
Запорізького району

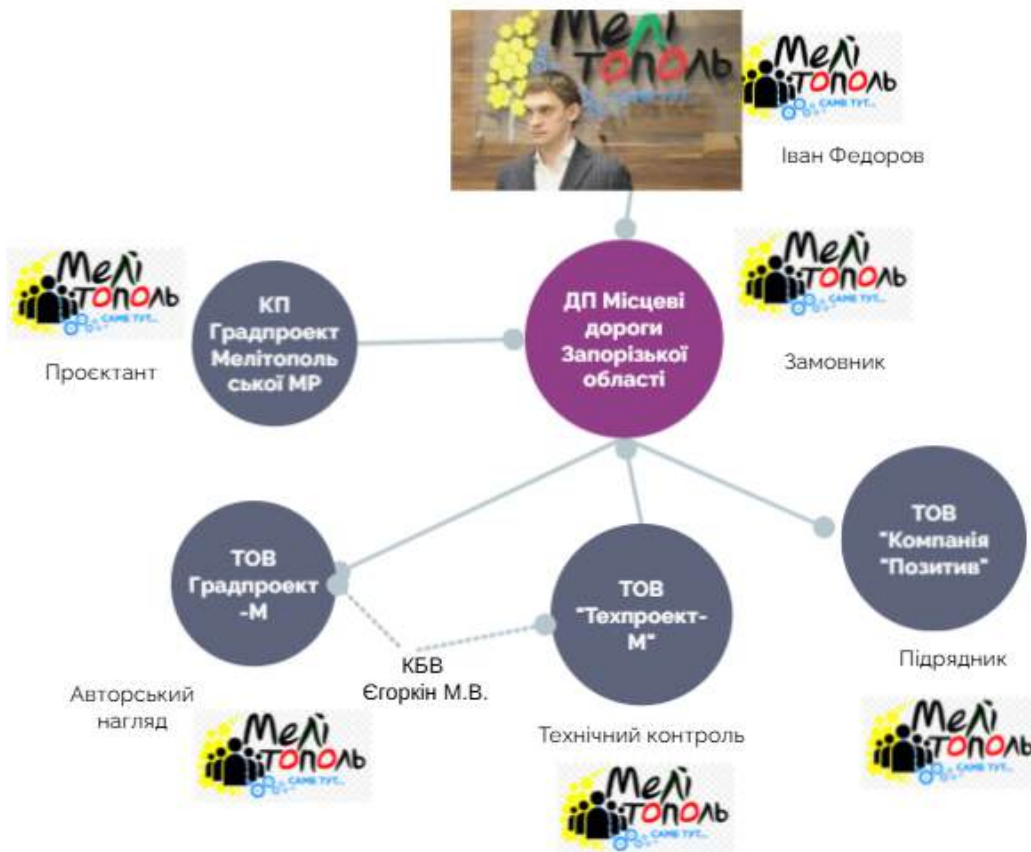

Процедури закупівель

1. Чи були всі закупівлі, пов'язані з реалізацією проєкту, проведені у конкурентний спосіб? Якщо ні, то чи існували підстави для проведення неконкурентних процедур?

Відповідь: Ні

Закупівлі робіт з проектування, технічного та авторського нагляду проведені без застосування електронної системи. Суми закупівель не перевищують 1500000,00грн. Закупівлі проводились із застосуванням Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022.

Перелік закупівель зазначено в Таблиці 2.

2. Чи були застосовані інші, ніж ціна, критерії оцінки тендерної пропозиції (нецінові критерії оцінки, вартість життєвого циклу)? Якщо так, то чи є використання таких критеріїв оцінки обґрунтованим та ефективним?

Відповідь: Ні

Згідно з тендерною документацією закупівель, єдиним критерієм визначення переможця є ціна.

3. Чи є ризики завищення вартості договорів?

Відповідь: Так

Зафіксовано можливі завищення ціни на бетонних сумішах, що є одним з основних матеріалів будівництва. Загальна сума завищення ціни тільки на цих позиціях може складати до **4 500 000** грн.

У кошторисі є й дорогівартісні позиції, які неможливо перевірити, що робить їх «непрозорими». Переважно це технічне обладнання без чіткого опису характеристик або ціни якого можна дізнатися лише «під замовлення». Серед таких – вентиляція, підйомники, насосні установки та системи автоматики.

№ з/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Ціна згідно кошторису, без ПДВ, грн	Порівняль на ціна, без ПДВ грн	Різниця в ціні, %	Примітки
1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	53,05	4770,7	2458	+60%	M-350 B25 https://www.zbi.zp.ua/tovarnyj-beton
2	Полістеролбетон 350 кг/м3	м3	167,99	6075	2666	+110%	https://teplobeton.com/polistirolbeton-d350/
3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1231,86	4950,00	2625	+55%	M-400 B30 https://www.zbi.zp.ua/tovarnyj-beton
4	Дизель-генератор з АВР в кожусі, IP23, 380В, (16 кВт) SOELMO PDT44Aa у складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з збудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР	шт	1	789324,5	316005	+65%	https://plusenergy.com.ua/ua/p930001266-trehfaznyj-dizelnyj-generator.html?srsltid=AfmBOopdaagI2oqnNnHKBOmiqyAjOMmHEJhk-MWrP8rZRICr6yemlp

4. Чи є ознаки зловживань в процедурі закупівлі, які могли спотворити результати торгів?

Відповідь: Так

Є ризик закупівлі у одного виконавця. RISK-2-15 — Закупівля робіт у одного учасника.

Керівник ДП «Місцеві дороги Запорізької області» Репашевська Вікторія Дмитрівна до тимчасової окупації міста Мелітополь працювала начальником відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області. Після призначення головою Запорізької ОДА(ОВА) в лютому 2024 року мера Мелітополя Івана Федорова (у відпустці), на посади в органах влади Запорізької області масово призначаються экс-підлегли Івана Федорова мелітопольці. 01.05.2024 року на посаду керівника ДП «Місцеві дороги Запорізької області» призначається Репашевська Вікторія Дмитрівна.

І ВКБ Мелітопольської міської ради, і ДП «Місцеві дороги Запорізької області» починаючи з 2021 року переважно обирали один і той самий перелік виконавців:

проектувальник- КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради,
експерт - ТОВ «Південьекспортпроект»,
технічний нагляд -ТОВ “ТЕХПРОЕКТ-М”,
будівельні роботи - ТОВ "Компанія Позитив".

Ці ж самі виконавці на замовлення ДП «Місцеві дороги Запорізької області» в даний момент реалізують інші проекти нового будівництва протирадіаційних укриттів в запорізьких школах. Були обрані у процедурах відкритих торгів без конкуренції за участі 1 учасника або без використання електронної системи.

5. Чи є ризики, пов’язані з переможцем закупівель?

Відповідь: Так

За даними аналітичної системи Youcontrol, [ТОВ «Компанія «Позитив»](#) була зареєстрована в 2009 році в елітному селищі Сонячне Запорізького району. В 2021 році змінила реєстрацію на мелітопольську. На сьогодні належить Максиму Гайдаю та знов змінила реєстрацію на селище Сонячне Запорізького району.

Раніше власником був [Микола Бєлий](#) – директор ТОВ “Віконда-Запоріжжя”, депутат Запорізької міськради та спів володіє “Багатопрофільною клінікою Святого Миколая”. Раніше Микола Бєлий також був власником ТОВ “Компанія позитив”, яка отримала підрядів на 171 млн грн, зокрема і від Запорізької міськради.

Нині фірмою володіє колишній директор одного з фірмових салонів “Віконда” в Запоріжжі. Левову частку підрядів “Компанія позитив” отримала від структур **мелітопольської мерії**, де міським головою був представник “Блоку Петра Порошенка Солідарність” (нині Європейська солідарність) – [Сергій Мінько](#), а його заступником був теж представник цієї партії – **Іван Федоров**. Також Мінько зазначав, що серед депутатів у нього є більшість у міській раді. Чималу кількість підрядів у Мелітополі отримала і близька Миколі Белому фірма ТОВ “**Віконда-Мелітополь**” – на 4 млн грн.

Статутний капітал фірми складає 60 500,00 грн.

У власності компанії лише один автомобіль і на той накладено **обтяження** банком.

Автотранспорт у власності

Ймовірний номерний знак 	Марка	Модель	Рік випуску	Колір	Тип авто	Тип кузова
 AP4325BO	ГАЗ	330202	2007	БІЛИЙ	ВАНТАЖНИЙ	БОРТОВИЙ МАЛОТОНАЖНИЙ

Компанія є фігурантом кримінальної справи, так згідно даних судового реєстру в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201708000000058 від 01 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України:

Під час досудового розслідування, було отримано інформацію від працівників УСБУ в Запорізькій області про те, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітального ремонту (заміни) віконних блоків в навчальних закладах освіти м. Енергодар, на загальну суму приблизно 6 млн. грн. При цьому слід зазначити, що переможцями вказаних торгів стали:

-ТОВ «Компанія Позитив» (код ЄДРПОУ [36315588](#), реєстрація Запорізька область, с.Сонячне, вул. Сонячне шосе,1).

З 2015 року компанія «Позитив» отримала державних замовлень більш ніж на 420 млн гривень. В Мелітополі та в його районі, в той час, коли при владі була команда Мінько-Федорова. «Позитив» [виконував підряди](#) проєктів «Великого будівництва», а за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ завершила реконструкцію колишнього дитячого садочка під [житло для ВПО](#) за кошти гранту Уряду Німеччини, залучені через Український Фонд соціальних інвестицій.

За інформацією медіа, участь «Позитиву» в деяких капітальних ремонтах [викликала увагу правоохоронних](#) органів.

При капремонті мелітопольської школи №8 та здійсненні заходів з енергозбереження та благоустрою школи №23 правоохоронці запідозрили завищення цін на будівельні матеріали – загалом на 2,5 мільйони гривень. Також підприємство підозрювали в тому, що воно двічі отримало фінансування робіт з капремонту спортзали. Крім того, деякі роботи, оформлені актами в 2018 році, доробляли вже в 2019.

Проте у відкритих джерелах не вдалося знайти інформацію щодо того, чим закінчилися розслідування цих проваджень.

Компанія була [фігурантом](#) антикорупційних розслідувань.

Станом на 03.10.2024 року Компанія [отримала підряди](#) на будівництво «підземних шкіл» в Січовому колеґіумі, колеґіумі «Елінт», Біленківському ліцеї «Лідер», 88 школі та на ремонт у ряді укриттів.

Підйом у діяльності розпочався з червня 2024 року, з початком тендерів ДП «Місцеві дороги Запорізької області» з визначення виконавців робіт з будівництва протирадіаційних укриттів в освітніх закладах. Станом на 03.10.2024 року між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та

ТОВ «Компанія Позитив» [укладено](#) 6 Угод на загальну суму у 568 400 683,00. Тобто, на суму **всієї первинної субвенції** в Запорізькій області з Державного бюджету місцевому.

Вимоги Тендерної документації

1. Чи не було встановлено малий строк подачі пропозицій?

Відповідь: Ні

Строк подачі пропозицій тривав майже місяць: з 19.09.2024 до 22.10.2024 року.

2. Чи має Технічне завдання чітко визначеної марки/моделі товару, нечіткий опис характеристик товару та ін.?

Відповідь: Частково

У складі оприлюдненої в системі Prozorro Тендерної документації [додаток 2](#) містить чіткий перелік будівельних матеріалів з зазначенням марки та характеристик.

3. Чи кваліфікаційні критерії містять вимоги, які можуть штучно обмежувати конкуренцію?

Відповідь: Так

У п. 1.2.1. Додатку 1 до Тендерної документації вказано: «Аналогічним договором буде вважатися повністю виконаний договір, який підтверджує наявність в учасника досвіду щодо виконання робіт, а саме: нового будівництва або реконструкції, або капітального ремонту подібні за змістом, своєю правовою природою або предметом закупівлі або складом робіт, які виконувались за договором на об'єктах цивільного будівництва та/або на об'єктах соціальної інфраструктури (школи, лікарні, житлові будівлі, театри, стадіони, тощо), за класом наслідків не нижче СС2.» Безпідставно вказуючи «на об'єктах цивільного будівництва та/або на об'єктах соціальної інфраструктури (школи, лікарні, житлові будівлі, театри, стадіони, тощо)», Замовник порушує вимоги Статті 5 Закону про публічні закупівлі, зокрема добросовісної конкуренції серед учасників, принципи недискримінації, максимальної економії та ефективності. Порушення вищезгаданих принципів у підсумку викликає збільшення витрат державних коштів.

4. Чи містить Тендерна документація нетипові вимоги, такі як огляд об'єкту, проходження процедур погодження/узгодження, проведення не передбачених законом випробувань/тестувань, інші вимоги?

Відповідь: Ні

5. Наявність вимог/питань у учасників.

Відповідь: Так

Звернення щодо [дискримінаційних](#) вимог.

Відповідь надана впродовж 3 днів.

Договір

В системі [DREAM](#) повідомляється, що фінансове покриття є на рівні 0,8% від суми проекту у **63 200 000,00** грн. Станом на кінець листопада 2024 року за даними Dream Аналітика по об'єкту [укладено](#) один контракт .

Згідно умов додаткової угоди від 22.10.2024 до Договору № 22/10-НБ/Сем від **22.10.2024** між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ТОВ "Компанія Позитив":

Ціна Договору становить **60 587 710,00** грн (при зазначених в системі DREAM 46 млн.), в.т ч. ПДВ - **10 097 951,66** грн. З них кошти обласного (місцевого) бюджету - **60 587 710,00** грн.

З них на 2024 рік - **60 587 710,00** грн.

Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».

Змінами до Договору від 22.10.2024 року (внесеними на підставі рішення Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 29.08.2024 №4 «Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 15.12.2023р. №19 “Про бюджет Павлівської сільської територіальної громади на 2024 рік”») передбачається здійснення **100% фінансування в 2024 році коштом обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя – в розмірі 60 587 710,00 грн.**

Строк закінчення будівельних робіт змінено з грудня 2025 року на 31.12.2024 року.

Термін виконання робіт: з 22.10.2024 р од 31.12.2024 р. Календарний графік викладено в новій редакції, **укриття повинні побудувати за 2 місяці.**

Згідно плану фінансування робіт проєкт буде **повністю профінансовано в грудні 2024 року.**

Технічне завдання визначає, що Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п'ятої, сьомої — дев'ятої статті 41 Закону та Особливостей.

І встановлює, що **істотними** умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), **ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та** можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

П.18.6 Договору визначає, що підготовчі роботи можуть здійснюватись за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

П.9.3 Договору **забороняє передачу проєктної документації третім особам.**

Договірна ціна є **динамічною** та визначається відповідно до вимог нормативних актів у сфері ціноутворення в будівництві та повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

06.11.2024 року укладена додаткова угода №2 на підставі листа Підрядника від 30.10.2024 No 30/1, п. 4.7. договору від 22.10.2024 No 22/10-НБ/Сем яким встановлено, що розмір попередньої оплати для виконання робіт за Договором становить **18 176 313,00** грн (вісімнадцять мільйонів сто сімдесят шість тисяч триста тринадцять гривень 0 копійок).

Попередня оплата (аванс) надається на строк до 18.12.2024 включно.

06.11.2024 була укладена і третя додаткова угода, яка внесла зміни в додаткову угоду №2 і зменшила суму авансу. На підставі листа Підрядника від 06.11.2024 № 06/11, п 4.7. договору від 22.10.2024 оN 22/10-НБ/Сем, сторони дійшли згоди внести зміни до п. 1 додаткової угоди № 2 від 06.11.2024 до Договору в частині розміру суми попередньої оплати, виклавши його в новій редакції, що розмір попередньої оплати для виконання робіт за Договором становить **6 000 000,00** грн (шість мільйонів гривень 00 копійок). Попередня оплата (аванс) надається на строк до 18.12.2024 включно.

Додатковими угодами також зменшено на 12 місяців строк проведення робіт - з **31.10.2024** року до **31.12.2024** року. Тобто термін виконання всіх будівельних робіт - 2 місяці.

Оприлюднений в системі Prozorro Договір не містить в якості невід'ємного додатку проектно-кошторисної документації (ПКД). В тексті Договору відсутнє посилання на назву додатку чи додаткової Угоди, яка містить ПКД. Прикінцеві положення Договору в переліку невід'ємних додатків також не мають ПКД і його складових. Що має ознаки порушення ст. 877 Цивільного кодексу України і несе ризик визнання Договору недійсним.

ПКД у відкритому доступі відсутня. Надана у відповідь на запит.

31.10.2024 року отримано дозвіл на будівництво ІУ012241030809.

Таблиця 1

Таблиця порівняння даних дослідження з оприлюдненими даними ініціатора проекту та публічною інформацією, наданою у відповідь на запит

Найменування	DREAM	Дослідження	Відповідь на запит
Проектувальник	КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради Запорізької області	КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради Запорізької області	КП «Градпроект» Мелітопольської міської ради Запорізької області
Експерт	ТОВ «Південьекспертпро ект Експертний звіт № 0043-24Е від 24 квітня 2024	ТОВ «Південьекспертпро ект Експертний звіт № 0043-24Е від 24 квітня 2024	
Технічний нагляд	ТОВ "ТЕХПРОЕКТ-М"	ТОВ "ТЕХПРОЕКТ-М"	
Авторський нагляд	ТОВ "Градпроект-М"	ТОВ "Градпроект-М"	

Виконавець будівельних робіт	ТОВ "Компанія Позитив"	ТОВ "Компанія Позитив"	ТОВ "Компанія Позитив"
Балансоутримувач	Павлівська сільська рада	Павлівська сільська рада	
Ініціатор	Павлівська сільська рада	Павлівська сільська рада	
Розпорядник бюджетних коштів/Замовник	ДП «Місцеві дороги Запорізької області», 42698149	ДП «Місцеві дороги Запорізької області», 42698149	

Таблиця 2

Перелік закупівель, здійснених в рамках проєкту

Процедура закупівлі	Ідентифікатор закупівлі	Предмет закупівлі	Переможець закупівлі	Сума закупівлі, грн
Закупівля без використання електронної системи	UA-2024-10-28-005422-a	Розробка проєктної документації по об'єкту: «Реконструкція електропостачання для приєднання протирадіаційного укриття Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області»	ФОП ДАНИЛЬЧЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ #2800910512	169 935,16

<p>Закупівля без використання електронної системи</p>	<p>UA-2024-04-22-012008-a</p>	<p>області за адресою: вул. Шкільна, буд. 5А, с. Семененкове, Запорізький район, Запорізька область</p> <p>Розробка проєктної документації по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семененкове, Запорізький район, Запорізька область</p>	<p>КП "ГРАДПРОЕКТ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ</p> <p>#30085874</p>	<p>533 677,48</p>
<p>Відкриті торги з особливостями</p>	<p>UA-2024-09-18-008778-a</p>	<p>Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семененкове, Запорізький район, Запорізька область</p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив"</p> <p>#36315588</p>	<p>60 587 710,00</p>
<p>Закупівля без використання електронної системи</p>	<p>UA-2024-10-24-014129-a</p>	<p>Роботи зі здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт, що передбачені</p>	<p>ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М"</p> <p>#44025768</p>	<p>74 947,37</p>

<p>Закупівля без використання електронної системи</p>	<p>UA-2024-10-24-014818-a</p>	<p>проектною документацією по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семенківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семенкове, Запорізький район, Запорізька область</p> <p>Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та перевіркою актів виконаних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семенківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семенкове, Запорізький район, Запорізька область</p>	<p>ТОВ "ТЕХПРОЕКТ-М"</p> <p>#43442203</p>	<p>689 734,04</p>
---	-------------------------------	---	---	-------------------

Таблиця 3

Порівняння запланованих і фактичних видатків

Ідентифікатор закупівлі	Предмет закупівлі	Переможець закупівлі	Сума закупівлі згідно даним системи Prozorro, грн	Розбивка бюджету згідно даним системи DREAM, грн https://dream.gov.ua/ua/project/DREAM-UA-230424-7B147542/profile?fromFilter%5blocation%5d=UA230000000064947&fromFilter%5bstatus%5d=active&fromFilter%5bcoverage%5d=2
UA-2024-10-28-005422-a	Розробка проектної документації по об'єкту: «Реконструкція електропостачання для приєднання протирадіаційного укриття Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: вул.Шкільна, буд.5А, с.Семененкове, Запорізький район, Запорізька область	ФОП ДАНИЛЬЧЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ #2800910512	169 935,16	-
UA-2024-04-22-012008-a	Розробка проектної документації по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул.	КП "ГРАДПРОЕКТ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ #30085874	533 677,48	-

	Шкільна, 5А, с. Семененкове, Запорізький район, Запорізька область			
UA-2024-09-18-008778-a	Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с.Семененкове, Запорізький район, Запорізька область	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив" #36315588	60 587 710,00	-
UA-2024-10-24-014129-a	Роботи зі здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт, що передбачені проектною документацією по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семененківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семененкове, Запорізький район, Запорізька область	ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" #44025768	74 947,37	-
UA-2024-10-24-014818-a	Роботи зі здійснення технічного нагляду за	ТОВ "ТЕХПРОЕКТ-М"	689 734,04	-

	виконанням будівельних робіт та перевіркою актів виконаних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Семенківського ліцею Павлівської сільської ради Запорізького району за адресою: вул. Шкільна, 5А, с. Семенкове, Запорізький район, Запорізька область	#43442203		
--	---	-----------	--	--

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту «Прозора відбудова: Моніторинг відбудови соціальної інфраструктури», що реалізується в межах субгрантингового компоненту проєкту «Контроль витрат на відновлення», який реалізується за підтримки Європейського Союзу.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Народний захист» і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу. Проєкт «Контроль витрат на відновлення» впроваджують ГО «Центр економічної стратегії», ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» та ГО «Технології прогресу».

